**PROVINCIA DI LECCE**
**CITTÀ DI COLLEPASSO**

Progetto di valorizzazione e risanamento conservativo della *Cappella della Santissima Trinità,* detta anche *dello Spirito Santo*.
Importo progetto €360.000,00.
CUP: J39d24000430004

REGIONE PUGLIA

## ***Progetto esecutivo architettonico***



COMMITTENTE:
**Comune di Collepasso (LE)**
Il Dirigente

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI:
**Arch. Ada Toni**
Coordinatore della sicurezza:
**Arch. Roberto Rosati**

R.U.P.:
**Arch. Paola Ria**

Otranto - Giugno 2026

# DIAGRAMMA DI GANTT

# ALLEGATO "A"

## Comune di Collepasso
Provincia di Lecce

# DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

| | |
|---|---|
| **OGGETTO:** | Progetto di valorizzazione e risanamento conservativo della Cappella della Santissima Trinità, detta anche dello Spirito Santo |
| **COMMITTENTE:** | Comune di Collepasso. |
| **CANTIERE:** | via Vittorio Emanuele III, 3, Collepasso (Lecce) |

Collepasso, 17/06/2026

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

(Architetto Rosati Roberto)

per presa visione

**IL COMMITTENTE**

(RUP Ria Paola)

**architetto Rosati Roberto**
p.zza Cavallotti
73020 Cutrofiano (Lecce)
Tel.: 3280542450
E-Mail: r.rosati@pec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

**Tabella Analitica Gantt**

| FASI DI LAVORO | Z | I | gg L | gg C | data Iniziale | data Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Allestimento del cantiere** | | | | | | |
| **Preparazione delle aree di cantiere** | | | | | | |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 1 | E | 2 | 2 | 14/09/2026 | 15/09/2026 |
| Realizzazione della viabilità di cantiere | 1 | E | 2 | 2 | 14/09/2026 | 15/09/2026 |
| **Apprestamenti del cantiere** | | | | | | |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 1 | E | 1 | 1 | 16/09/2026 | 16/09/2026 |
| Allestimento di servizi sanitari del cantiere | 1 | E | 1 | 1 | 17/09/2026 | 17/09/2026 |
| Montaggio del ponteggio metallico fisso | 1 | E | 3 | 5 | 18/09/2026 | 22/09/2026 |
| Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree | 1 | E | 2 | 2 | 17/09/2026 | 18/09/2026 |
| **Restauro intonaci** | | | | | | |
| **Operazioni di disinfestazione e disinfezione** | | | | | | |
| Disinfestazione dalla vegetazione superiore di intonaci | 1 | E | 3 | 3 | 23/09/2026 | 25/09/2026 |
| Disinfezione da microorganismi di intonaci | 1 | E | 3 | 3 | 23/09/2026 | 25/09/2026 |
| **Operazioni preliminari** | | | | | | |
| Rimozione di depositi superficiali incoerenti su intonaci | 1 | E | 3 | 3 | 28/09/2026 | 30/09/2026 |
| Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su intonaci | 1 | E | 3 | 3 | 28/09/2026 | 30/09/2026 |
| Applicazione bendaggi di sostegno e protezione su intonaci | 1 | E | 4 | 4 | 28/09/2026 | 01/10/2026 |
| Rimozione meccanica di stuccature inidonee di intonaci | 1 | E | 1 | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 |
| **Operazioni di consolidamento** | | | | | | |
| Ristabilimento della coesione di intonaci | 1 | E | 1 | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 |
| Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco | 1 | E | 1 | 1 | 05/10/2026 | 05/10/2026 |
| Applicazione di perni su intonaci | 1 | E | 1 | 1 | 06/10/2026 | 06/10/2026 |
| **Operazioni di stuccatura, reintegrazione e protezione** | | | | | | |
| Stuccatura di cadute di strati di intonaci | 1 | E | 2 | 2 | 07/10/2026 | 08/10/2026 |
| Protezione superficiale di intonaci | 1 | E | 2 | 4 | 09/10/2026 | 12/10/2026 |
| **Restauro fregi e/o superfici in pietra** | | | | | | |
| **Operazioni di disinfestazione e disinfezione** | | | | | | |
| Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra | 1 | E | 2 | 2 | 13/10/2026 | 14/10/2026 |
| Disinfezione da microorganismi di opere in pietra | 1 | E | 3 | 3 | 13/10/2026 | 15/10/2026 |
| **Operazioni preliminari** | | | | | | |
| Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in pietra | 1 | E | 4 | 6 | 14/10/2026 | 19/10/2026 |
| Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su opere in pietra | 1 | E | 1 | 1 | 16/10/2026 | 16/10/2026 |
| Rimozione meccanica di stuccature su opere in pietra | 1 | E | 2 | 2 | 19/10/2026 | 20/10/2026 |
| Stuccatura e microstuccatura temporanea di opere in pietra | 1 | E | 2 | 2 | 21/10/2026 | 22/10/2026 |
| **Operazioni di pulitura chimica e chimico-fisica** | | | | | | |
| Rimozione di depositi superficiali coerenti su opere in pietra con acqua nebulizzata | 1 | E | 1 | 1 | 22/10/2026 | 22/10/2026 |
| Rimozione di depositi superficiali coerenti su opere in pietra con impacchi | 1 | E | 1 | 1 | 23/10/2026 | 23/10/2026 |
| **Operazioni di consolidamento** | | | | | | |
| Ristabilimento della coesione di opere in pietra | 1 | E | 3 | 3 | 26/10/2026 | 28/10/2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ristabilimento strutturale dell'adesione di opere in pietra | 1 | E | 2 | 2 | 27/10/2026 | 28/10/2026 |
| **Operazioni di integrazione di parti mancanti** | | | | | | |
| Integrazione di parti mancanti di opere in pietra | 1 | E | 4 | 6 | 28/10/2026 | 02/11/2026 |
| Revisione cromatica di integrazioni esistenti di opere in pietra | 1 | E | 3 | 5 | 29/10/2026 | 02/11/2026 |
| **Operazioni di stuccatura, microstuccatura e presentazione estetica** | | | | | | |
| Stuccatura con malta di opere in pietra | 1 | E | 1 | 1 | 02/11/2026 | 02/11/2026 |
| Microstuccatura con malta di opere in pietra | 1 | E | 1 | 1 | 02/11/2026 | 02/11/2026 |
| Revisione cromatica ad acquarello di opere in pietra | 1 | E | 2 | 2 | 03/11/2026 | 04/11/2026 |
| Protezione superficiale di opere in pietra | 1 | E | 4 | 4 | 09/11/2026 | 12/11/2026 |
| **Opere in legno** | | | | | | |
| **Operazioni preliminari** | | | | | | |
| Rimozione di depositi superficiali incoerenti su superfici lignee | 1 | E | 1 | 1 | 16/11/2026 | 16/11/2026 |
| Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici lignee | 1 | E | 1 | 1 | 17/11/2026 | 17/11/2026 |
| Preconsolidamento strutturale di elementi lignei | 1 | E | 1 | 1 | 18/11/2026 | 18/11/2026 |
| **Operazioni di pulitura** | | | | | | |
| Rimozione di depositi coerenti ed aderenti su superfici lignee | 1 | E | 1 | 1 | 20/11/2026 | 20/11/2026 |
| Rimozione di depositi coerenti ed aderenti su superfici lignee con laser | 1 | E | 1 | 1 | 23/11/2026 | 23/11/2026 |
| Rimozione di sostanze sovrammesse su elementi lignei | 1 | E | 1 | 1 | 24/11/2026 | 24/11/2026 |
| **Operazioni di disinfestazione** | | | | | | |
| Disinfestazione di elementi lignei per anossia | 1 | E | 1 | 1 | 25/11/2026 | 25/11/2026 |
| Disinfestazione di elementi lignei per impregnazione | 1 | E | 1 | 1 | 26/11/2026 | 26/11/2026 |
| Disinfestazione di elementi lignei per nebulizzazione | 1 | E | 1 | 1 | 27/11/2026 | 27/11/2026 |
| **Operazioni di consolidamento** | | | | | | |
| Ristabilimento della coesione di elementi lignei | 1 | E | 1 | 1 | 30/11/2026 | 30/11/2026 |
| Ristabilimento di adesione e coesione della pellicola pittorica su superfici lignee | 1 | E | 1 | 1 | 01/12/2026 | 01/12/2026 |
| **Operazioni di integrazione** | | | | | | |
| Integrazione di parti mancanti o danneggiate di elementi lignei | 1 | E | 1 | 1 | 02/12/2026 | 02/12/2026 |
| Integrazione pittorica di lacune o stuccature su superfici lignee | 1 | E | 1 | 1 | 02/12/2026 | 02/12/2026 |
| Integrazione della lamina metallica decorativa su superfici lignee | 1 | E | 1 | 1 | 03/12/2026 | 03/12/2026 |
| **Operazioni di protezione superficiale** | | | | | | |
| Applicazione di protettivo superficiale su superfici lignee | 1 | E | 1 | 1 | 04/12/2026 | 04/12/2026 |
| Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura | 1 | E | 1 | 1 | 07/12/2026 | 07/12/2026 |
| | 1 | E | 1 | 1 | 09/12/2026 | 09/12/2026 |
| | 1 | E | 3 | 3 | 21/12/2026 | 23/12/2026 |
| **Smobilizzo del cantiere** | | | | | | |
| Smontaggio del ponteggio metallico fisso | 1 | E | 2 | 2 | 28/12/2026 | 29/12/2026 |
| Pulizia generale dell'area di cantiere | 1 | E | 1 | 1 | 30/12/2026 | 30/12/2026 |
| Smobilizzo del cantiere | 1 | E | 1 | 1 | 31/12/2026 | 31/12/2026 |

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA


*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>


gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

| Nome attività | Durata |
|---|---|
| **Allestimento del cantiere** | 7 g |
| **Preparazione delle aree di cantiere** | 2 g |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al c | 2 g |
| Realizzazione della viabilità di cantiere | 2 g |
| **Apprestamenti del cantiere** | 5 g |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del ca | 1 g |
| Allestimento di servizi sanitari del cantiere | 1 g |
| Montaggio del ponteggio metallico fisso | 3 g |
| Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in | 2 g |
| **Restauro intonaci** | 14 g |
| **Operazioni di disinfestazione e disinfezione** | 3 g |
| Disinfestazione dalla vegetazione superiore di into | 3 g |
| Disinfezione da microorganismi di intonaci | 3 g |
| **Operazioni preliminari** | 4 g |
| Rimozione di depositi superficiali incoerenti su int | 3 g |
| Rimozione di depositi superficiali parzialmente ad | 3 g |
| Applicazione bendaggi di sostegno e protezione | 4 g |
| Rimozione meccanica di stuccature inidonee di in | 1 g |
| **Operazioni di consolidamento** | 3 g |
| Ristabilimento della coesione di intonaci | 1 g |
| Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario | 1 g |
| Applicazione di perni su intonaci | 1 g |
| **Operazioni di stuccatura, reintegrazione e protezio** | 4 g |
| Stuccatura di cadute di strati di intonaci | 2 g |
| Protezione superficiale di intonaci | 2 g |
| **Restauro fregi e/o superfici in pietra** | 23 g |
| **Operazioni di disinfestazione e disinfezione** | 3 g |
| Disinfestazione dalla vegetazione superiore di ope | 2 g |
| Disinfezione da microorganismi di opere in pietra | 3 g |
| **Operazioni preliminari** | 7 g |
| Rimozione di depositi superficiali incoerenti su op | 4 g |
| Rimozione di depositi superficiali parzialmente ad | 1 g |
| Rimozione meccanica di stuccature su opere in p | 2 g |
| Stuccatura e microstuccatura temporanea di oper | 2 g |
| **Operazioni di pulitura chimica e chimico-fisica** | 2 g |

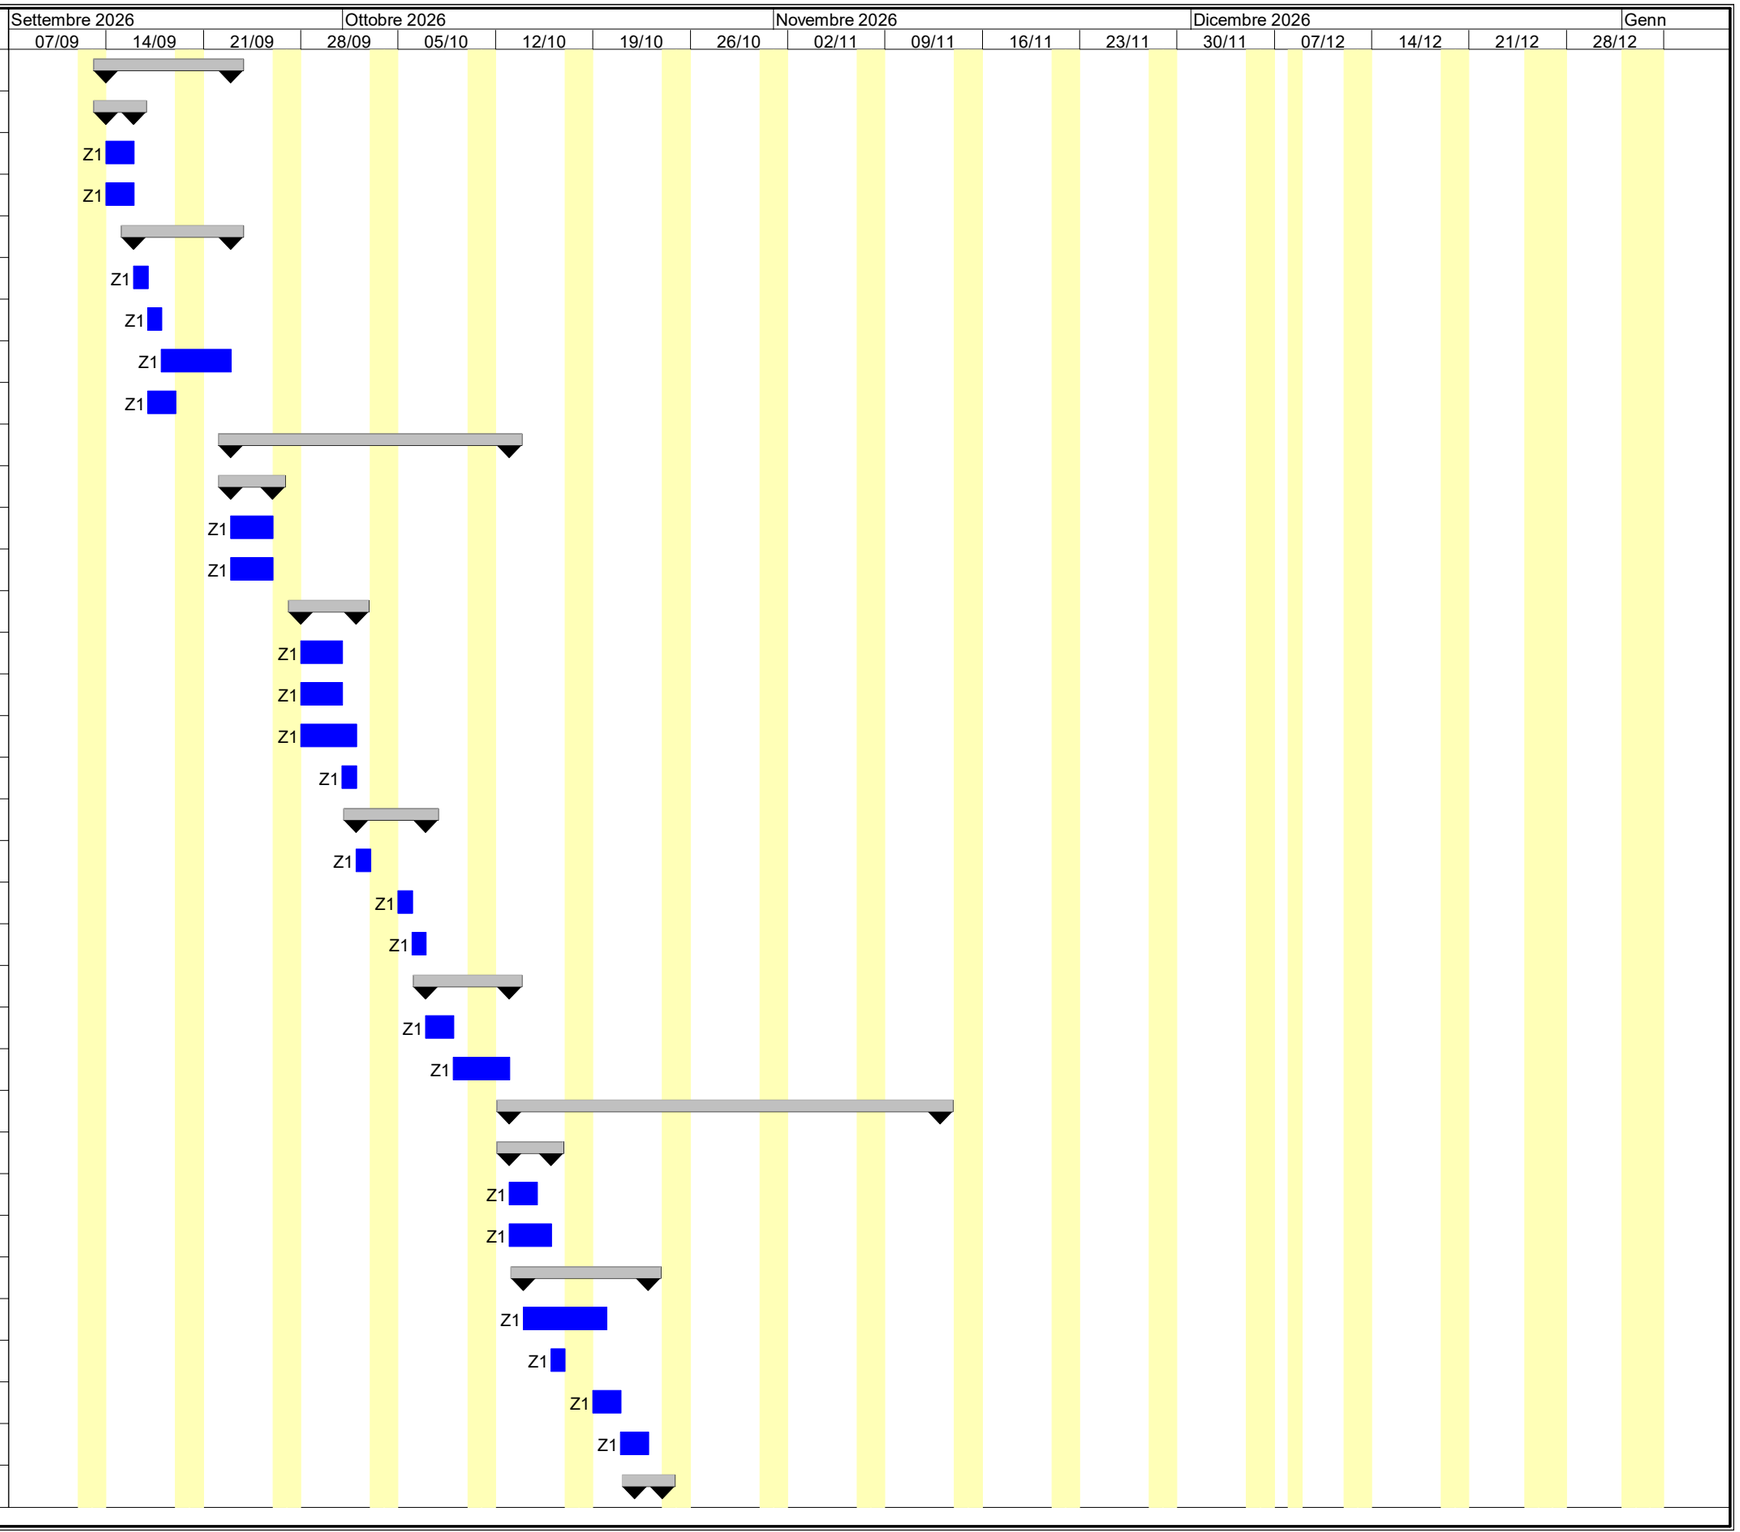

| Nome attività | Durata |
|---|---|
| Rimozione di depositi superficiali coerenti su oper | 1 g |
| Rimozione di depositi superficiali coerenti su oper | 1 g |
| **Operazioni di consolidamento** | 3 g |
| Ristabilimento della coesione di opere in pietra | 3 g |
| Ristabilimento strutturale dell'adesione di opere ir | 2 g |
| **Operazioni di integrazione di parti mancanti** | 4 g |
| Integrazione di parti mancanti di opere in pietra | 4 g |
| Revisione cromatica di integrazioni esistenti di op | 3 g |
| **Operazioni di stuccatura, microstuccatura e preser** | 9 g |
| Stuccatura con malta di opere in pietra | 1 g |
| Microstuccatura con malta di opere in pietra | 1 g |
| Revisione cromatica ad acquarello di opere in pie | 2 g |
| Protezione superficiale di opere in pietra | 4 g |
| **Opere in legno** | 27 g |
| **Operazioni preliminari** | 3 g |
| Rimozione di depositi superficiali incoerenti su su | 1 g |
| Rimozione di depositi superficiali parzialmente ad | 1 g |
| Preconsolidamento strutturale di elementi lignei | 1 g |
| **Operazioni di pulitura** | 3 g |
| Rimozione di depositi coerenti ed aderenti su sup | 1 g |
| Rimozione di depositi coerenti ed aderenti su sup | 1 g |
| Rimozione di sostanze sovrammesse su elementi | 1 g |
| **Operazioni di disinfestazione** | 3 g |
| Disinfestazione di elementi lignei per anossia | 1 g |
| Disinfestazione di elementi lignei per impregnazic | 1 g |
| Disinfestazione di elementi lignei per nebulizzazic | 1 g |
| **Operazioni di consolidamento** | 2 g |
| Ristabilimento della coesione di elementi lignei | 1 g |
| Ristabilimento di adesione e coesione della pellic | 1 g |
| **Operazioni di integrazione** | 2 g |
| Integrazione di parti mancanti o danneggiate di e | 1 g |
| Integrazione pittorica di lacune o stuccature su su | 1 g |
| Integrazione della lamina metallica decorativa su | 1 g |
| **Operazioni di protezione superficiale** | 13 g |
| Applicazione di protettivo superficiale su superfici | 1 g |

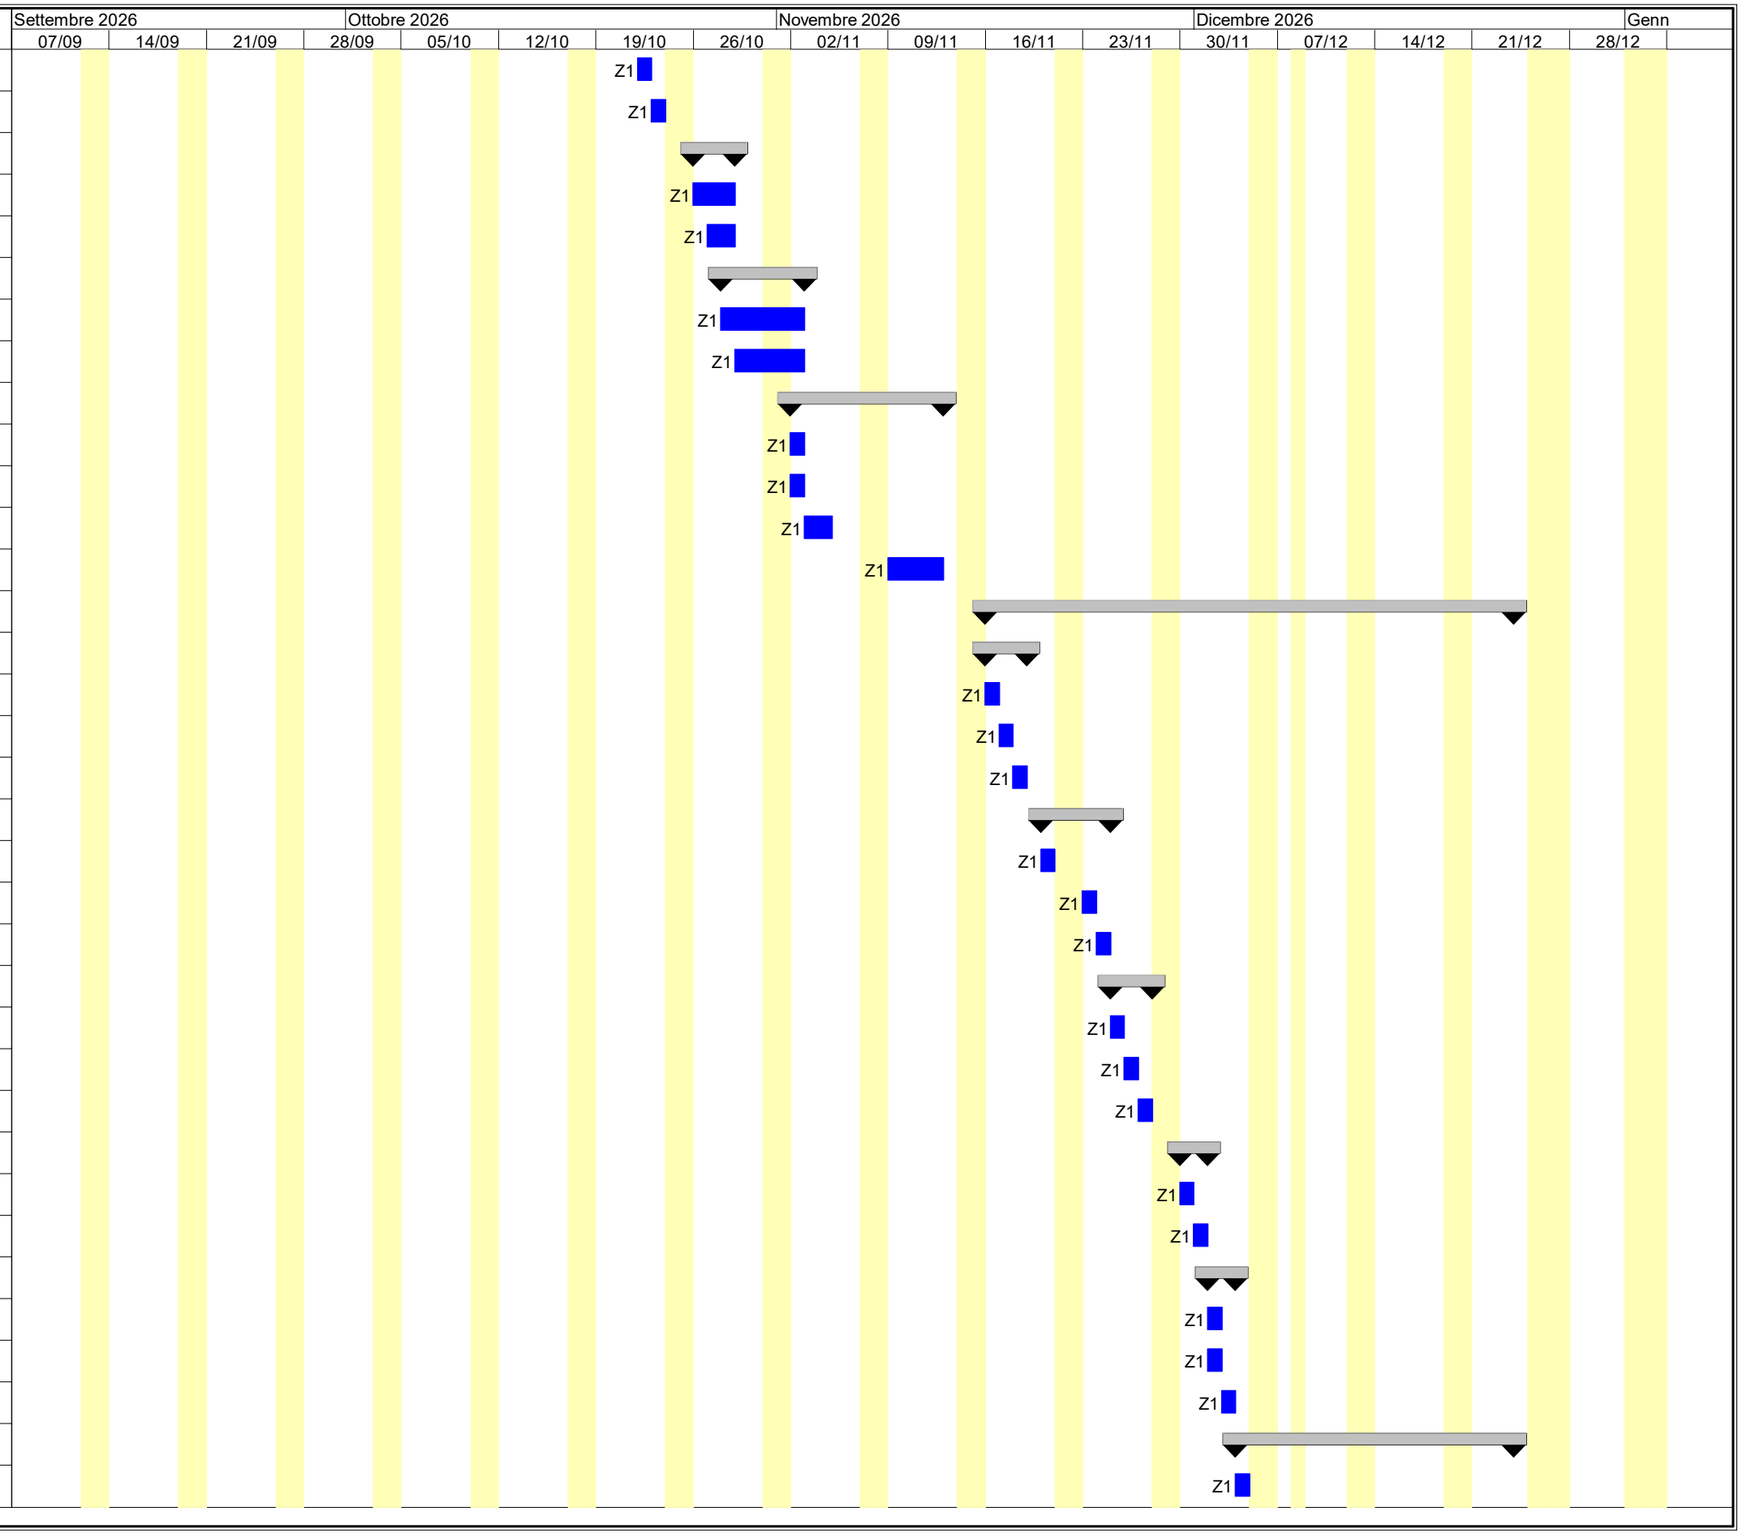

| Nome attività | Durata |
|---|---|
| Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura | 5 g |
| **Smobilizzo del cantiere** | 4 g |
| Smontaggio del ponteggio metallico fisso | 2 g |
| Pulizia generale dell'area di cantiere | 1 g |
| Smobilizzo del cantiere | 1 g |
| | |
| | |
| **LEGENDA Zona:** | |
| Z1 = ZONA UNICA | |

